

PROJEKTBERICHT

Sonderbau

Daten

Auftraggeber: Stadt Braunschweig
Baujahr: 2008
Bauzeit: 5 Monate
Baukosten: 1 Mio.€

Objekt


Bezeichnung: Instandsetzung Tiefgarage Packhof
Ort/Lage: Innenstadt Braunschweig
Anforderung: Instandsetzung der gesamten Fahrbahnfläche, Stützen und Wände der Tiefgarage



Leistung

Hauptleistung:

12.500 m² Aufbruch Gussasphalt
15.000 m² Betoninstandsetzung
12.500 m² Untergrundvorbereitung
12.500 m² Grundierung + Abdichtung
12.500 m² Gussasphalt
2000 m Flüssigfolie
350 m² Oberflächenschutzsystem

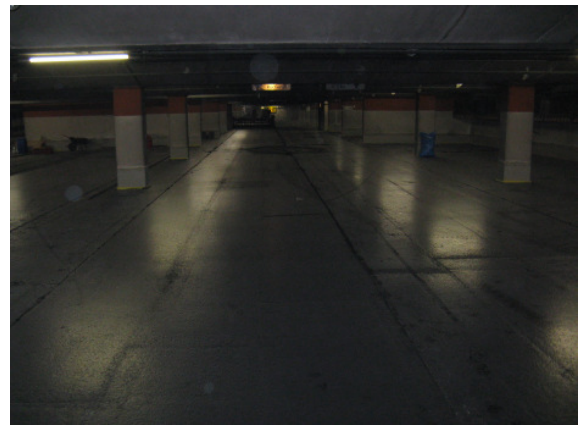

STRABAG

STRABAG AG
Direktion Straßenbau Hamburg
Bereich Niedersachsen-Ost
